
کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه
ERP SCM PCM HRM DCC CA BI
v5.8.7.4 web / build 2173
1393
تدارکات کالا و انبار
مدیریت بهای پروژه
مرکز کنترل اسناد
عملیات مبنا
اطلاعات مبنا
جداول پایه
ساختار کدگذاری کالا
تامین کنندگان
اطلاعات کالا و انبار
معرفی اقلام کالا
ضوابط موجودی انبار
استعلام بهای کالا
عملیات جاری
تقاضای خرید
سفارش خرید
درخواست از انبار
وارده به انبار
صادره از انبار
تعدیل موجودی
سایر اقدامات
عملیات ویژه
برآورد خرید کالا
کنترل پیشرفت سفارشات
بازرسی وکنترل کیفی
قیمت‌گذاری انبار
1.2.3
عملیات انبارگردانی
گزارشات و مستندات
طراحی گزارشات
بانک الصاقات
CARBON
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82
[10]
administra...
2017/08/02
1396/05/11
1438/11/09
12:22:01

کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه

ERP SCM PCM HRM DCC CA BI | v5.8.7.4 web / build 2165 | 1393

فهرست اقلام کالا

نوع	شماره	واحد	عنوان اصلی
i	68200204852439	no	,A/M20 ,Stainless Steel .Single Seal Ring .Ex d IIB T3 .IP 66 .with Locknut. Earth Tags. Shrouds and Sealing Washer
i			d ,C/M32 ,
i			,B/M25 ,S
i			nd ,E/M63 ,
i			Cal

[گروه کالا] » Ball valve F.B. API 6A

Service type

کد	شرح
*	Service type
۰	N/A
۱	Sour Service
۲	Sweet Service



Ball valve F.B. API 6A
,7 1/16"
,5000RTJ
,45K
,Temp Class PU/PV
,Mat. Class AA

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82 | [10] | administra... | 2017/08/02 | 1396/05/11 | 1438/11/09 | 12:15:06

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
159		Item No.	Desc.	UOM	Part No.	Barcode	Tech.				
160	0	68590276117226	SaltCoke Breeze (Bentonite) ,Powder ,50kg bag	no							
161	0	68593881854599	SaltCoke Breeze (Bentonite)	no			6859.0.0				
162	0	68594001013731	SaltCoke Breeze (Bentonite)	no							
163	0	68600075663605	Socket Outlet and Plug ,AC 380v ,63A ,3 Pine (1ph + N + PE) ,Ex d IIB T3 ,IP 66	no							
164	0	68600103820029	Socket Outlet and Plug ,AC 380v ,63A ,5 Pine (3ph + N + PE) ,Ex d IIB T3 ,for Zone 2 ,IP 65	no			6860.0.1.0.09.3.27.0				
165	0	68602085441423	Socket Outlet and Plug ,AC 220v ,16A ,3 Pine (1ph + N + PE) ,Ex d IIB T3 ,for Zone 1 ,IP 65	no			6860.1.3.2.09.2.27.0				
166	0	68602641795925	Socket Outlet and Plug ,AC 220v ,32A ,3 Pine (1ph + N + PE) ,Ex d IIB T3 ,IP 66	no							
167	0	68610909893772	Lightig Fixture (Fitting) ,for Fluorascent Lamp ,2x40w ,with Electronic Ballast ,Ex d IIB T3 ,for Zone 1 ,IP 65 ,with ceiling mounting and cable gland	no			6861.0.7.1.09.2.27.4				
168	1	6862*1000001	EX. INDUSTRAL AND COSED TYPE LUMINAIRES FOR 400 WATT HIGH PRESSURE MERCURY VAPOUR FLOODLIGHT, COMPLETE WITH CONTROL GEAR GLASS COVER COMPENSATING & ALL REQUIRED ACCESSORIES , EXde, IIA, T3	no							
169	1	6862*1000002	LAMPS, HIGH PRESSURE MERCURY VAPOUR 220/250 V , SCREW CAP , 400 WATT	no							

List

کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه

ERP SCM PCM HRM DCC CA BI | v5.8.7.4 web / build 2173 | 1393

اسناد انبار و تدارکات کالا / تقاضای خرید

تقاضای خرید کالا 1393/11/06:armoudli

چشمه خوش E۰۲۵N پروژه تهیه کالا و تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت » ۳۳۲

شماره ۱ | ۰ | تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ذینفع | پیمان | عنوان valve | رده ۰ | موقت

ردیف	شماره کالا	مقدار	ارزش	فی واحد	شماره/توضیح	ارز	مبلغ ارز
۱	75180925796120	۳.۰۰	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰			
۲	75161807921366	۳.۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰			
۳	75014169842953	۶.۰۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰			
۴	75023783444497	۱۵.۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰			
۵	75010744080236	۳.۰۰	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰			
۶	75022745683820	۶.۰۰	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰			
۷	75010066161378	۱۲.۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۰,۰۰۰			
۸	75012863853230	۹.۰۰	۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰			
۹	75023947348232	۶.۰۰	۲۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۰۰			
۱۰	75010155248679	۱۵.۰۰	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۰۰			

Choke valve (Fixed type) API 6A ,7 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1 [>no<]

ردیف/ج.ریال/ج.ارز ۱۹ | ۰ | ۰

CARBON ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82 | [10] | administra... | 2017/08/02 | 1396/05/11 | 1438/11/09 | 12:24:16

کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه

ERP SCM PCM HRM DCC CA BI | v5.8.7.4 web / build 2173 | 1393

اسناد انبار و تدارکات کالا / سفارش خرید

چشمه خوش E۰۲۵N پروژه تهیه کالا و تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت » ۳۳۲ 1393/11/06:armoudli

شماره | تاریخ | ذینفع | پیمان | عنوان | رده

گزینش اسناد کالا

۱۳

نوع	شماره	₵	تاریخ	سطر	ذینفع	پیمان	ش.فرعی	عنوان	رده	سریال
سفارش خرید خارجی	۳	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۶				valve-۶A	۰	۱۰۰۰۰۳۳۳
سفارش خرید خارجی	۲	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۱				valve-۶D	۰	۱۰۰۰۰۳۳۲
سفارش خرید خارجی	۱	۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۲				CHOKE VALVE	۰	۱۰۰۰۰۳۳۱

CARBON ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82 | [10] | administra... | 2017/08/02 | 1396/05/11 | 1438/11/09 | 12:24:39

کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه

ERP SCM PCM HRM DCC CA BI | v5.8.7.4 web / build 2173 | 1393

ایجاد بارکد کالا

نوع بارکد

Code ۳۹ | QR Code

Encoding: Numeric | Quiet zor: ۴

چشمه خوش E۰۲۵N پروژه تهیه کالا و تسهیلات سرچاهی و خط لوله

شماره ۲ | تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ذینفع ۱۰۰۲۲

ردیف	شماره کالا	مقدار	ارزش
۳	75014169842953	۶.۰۰	۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	75010744080236	۳.۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	75010066161378	۱۲.۰۰	۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	75012863853230	۹.۰۰	۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۰	75010155248679	۱۵.۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	75014056951958	۱۵.۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰
۱۲	75011470572322	۴۵.۰۰	۰۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۳	75011470572322	۱۵.۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۴	75010273714813	۶.۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۶	75113371378859	۶.۰۰	۱۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۷	75113867312921	۱۲.۰۰	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰

سفارش خرید خارجی 1393/11/27:mohamadi پتروزیست کیان

موقت | ش.مرجع ۰۰۰۰۶۸ | رده ۰

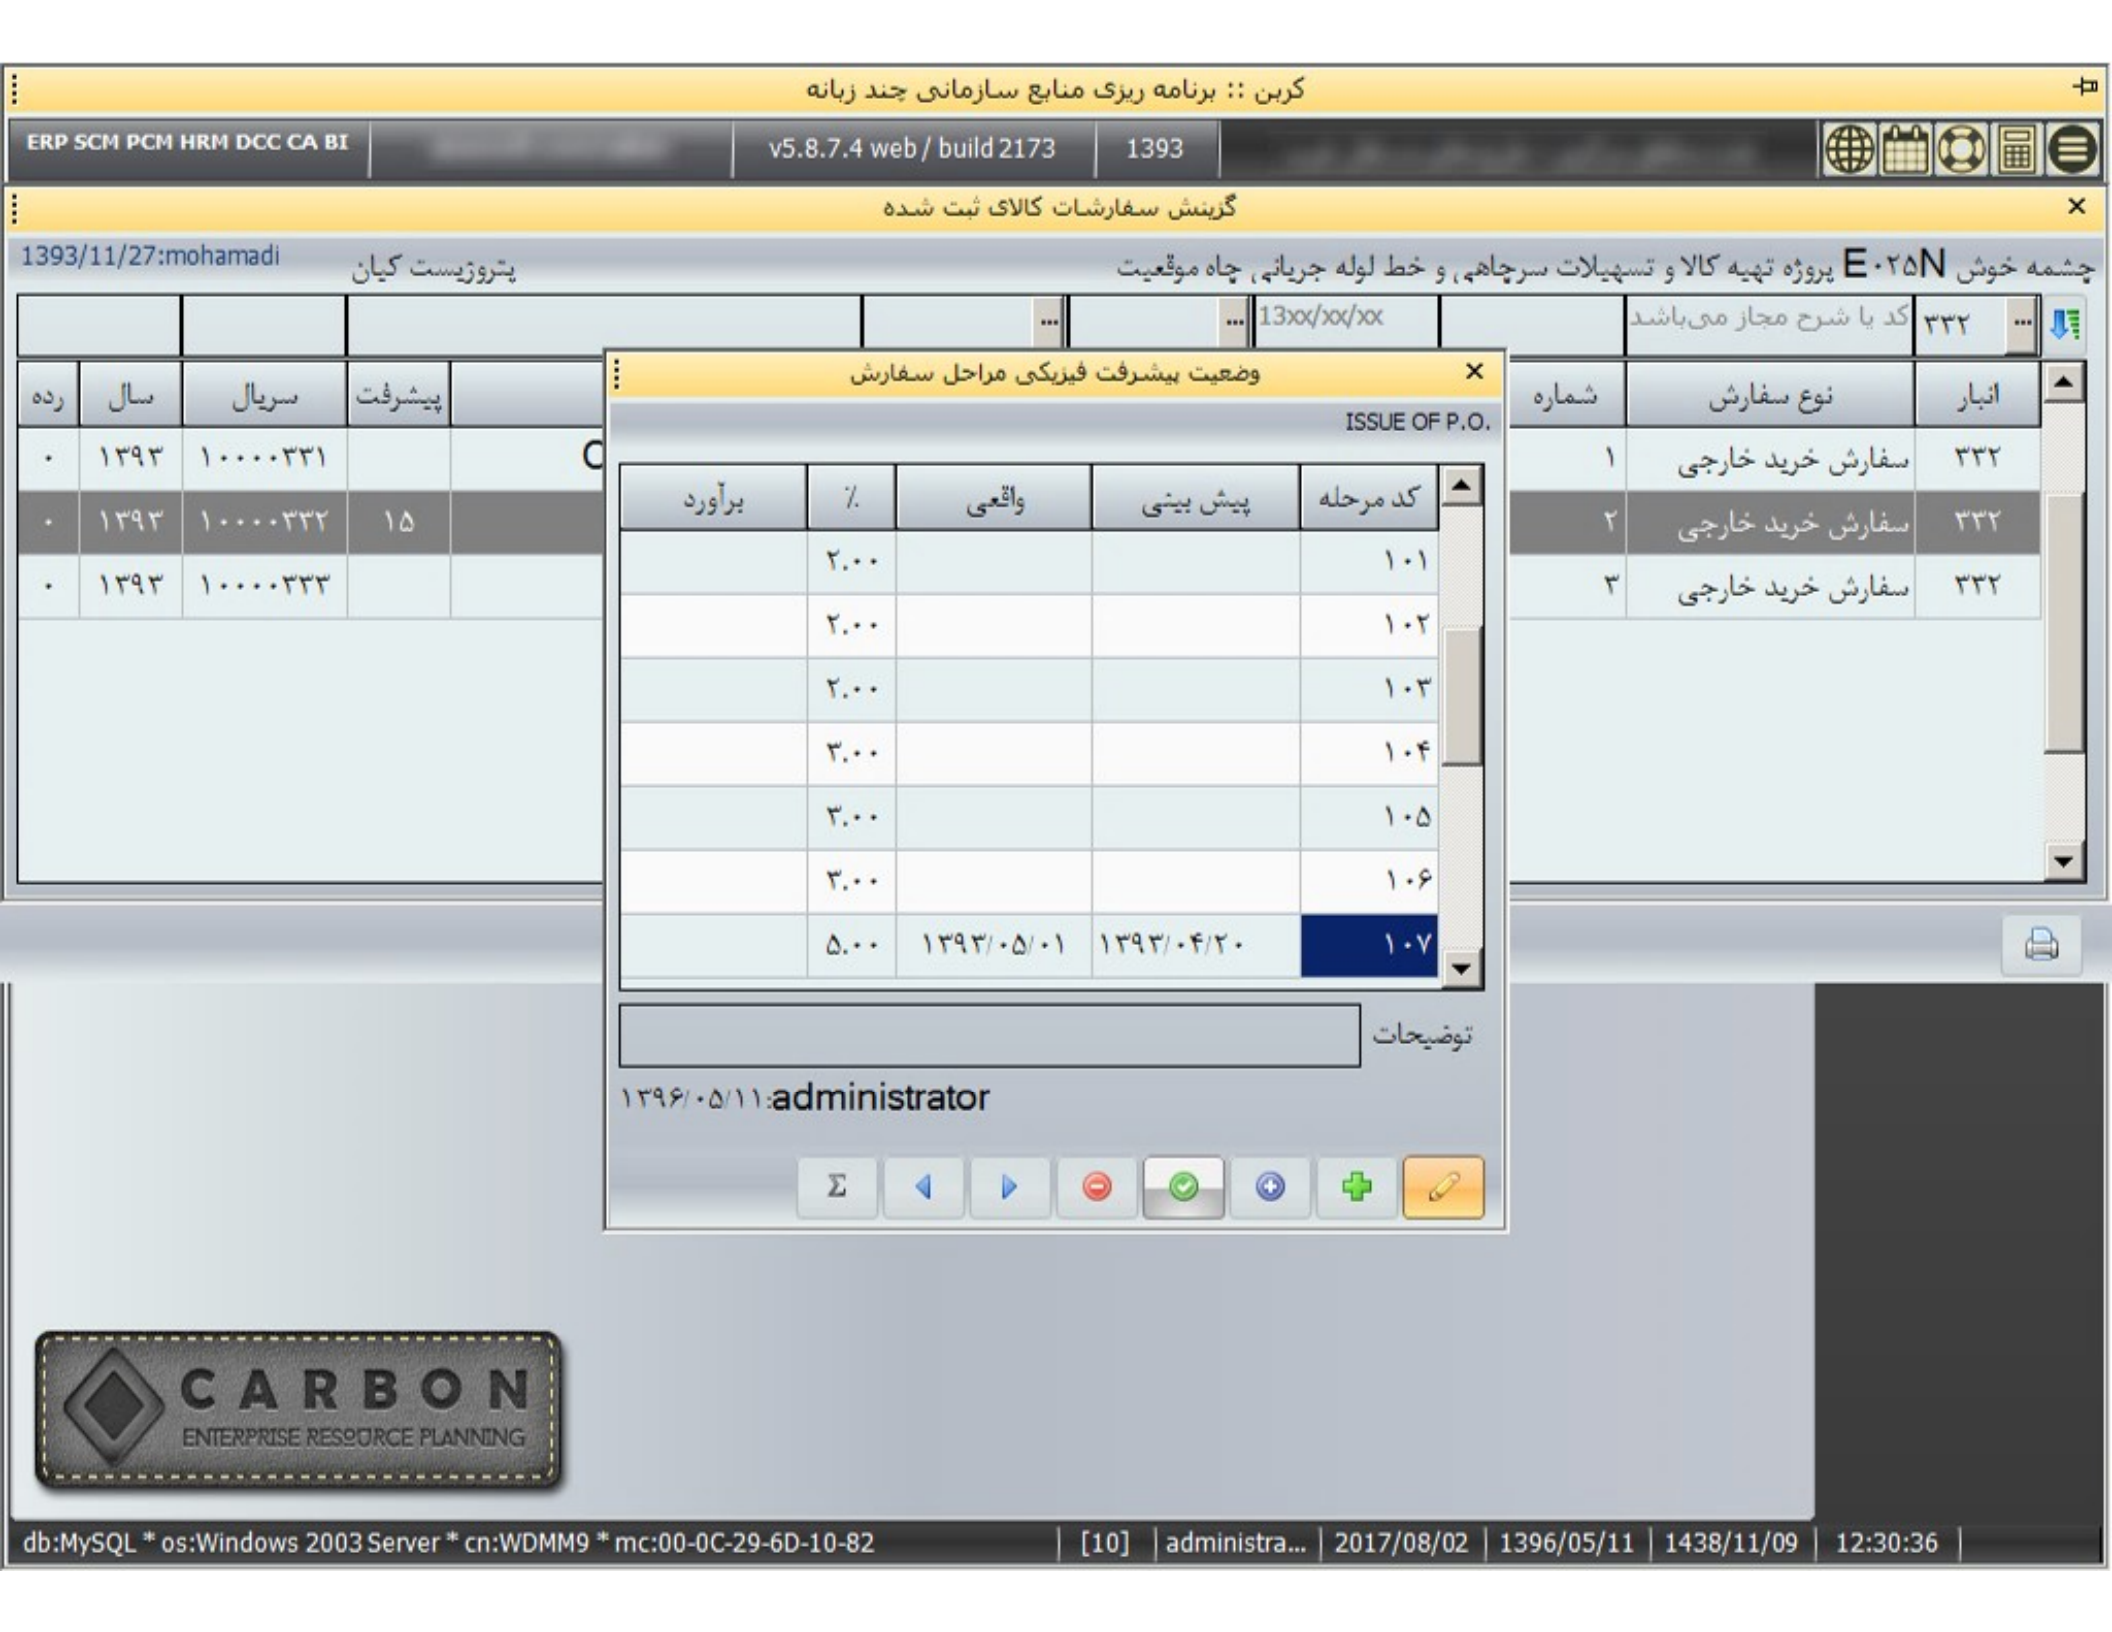
	سازنده	بازرس	سازنده دوم
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	
	۱۰۱۹۶	۱۰۰۲۷	

Ball valve F.B. ASME B16.34 ,8" ,1500#RTJ ,ASTM A105 ,Sweet Service [>no<]

ردیف/ج.ریال/ج.ارز ۱۱ | ۰ | ۰

CARBON ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82 | [10] | administra... | 2017/08/02 | 1396/05/11 | 1438/11/09 | 12:25:53


کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه
ERP SCM PCM HRM DCC CA BI
v5.8.7.4 web / build 2173
1393
گزینش سفارشات کالای ثبت شده
1393/11/27:mohamadi
پتروزیست کیان
چشمه خوش E۰۲۵N پروژه تهیه کالا و تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت
۳۳۲
کد یا شرح مجاز می‌باشد
13xx/xx/xx
انبار
نوع سفارش
شماره
۳۳۲ سفارش خرید خارجی ۱
۳۳۲ سفارش خرید خارجی ۲
۳۳۲ سفارش خرید خارجی ۳
سریال
سال
رده
۱۰۰۰۰۳۳۱ ۱۳۹۳ ۰
۱۰۰۰۰۳۳۲ ۱۳۹۳ ۰
۱۰۰۰۰۳۳۳ ۱۳۹۳ ۰
پیشرفت
۱۵
وضعیت پیشرفت فیزیکی مراحل سفارش
ISSUE OF P.O.
کد مرحله
پیش بینی
واقعی
٪
برآورد
۱۰۱ ۲.۰۰
۱۰۲ ۲.۰۰
۱۰۳ ۲.۰۰
۱۰۴ ۳.۰۰
۱۰۵ ۳.۰۰
۱۰۶ ۳.۰۰
۱۰۷ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۵.۰۰
توضیحات
۱۳۹۶/۰۵/۱۱:administrator
Σ
CARBON
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82
[10]
administra...
2017/08/02
1396/05/11
1438/11/09
12:30:36


کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه
ERP SCM PCM HRM DCC CA BI
v5.8.7.4 web / build 2173
1393
طراحی گزارشات انبار و تدارکات کالا
تفکیک گزارش
۰۱» سال
۰۲» ماه
۰۳» تاریخ
۰۴» نوع‌سند
۰۵» شماره‌سند
۰۶» انبار
۰۷» پیمان
۰۸» ذینفع/پیمانکار
۰۹» حساب
۱۰» تفصیلی ۱/سازنده
۱۱» تفصیلی ۲/سازنده
شروط گزارش و محدوده اطلاعات
محدوده تاریخ از
۱۳۹۳/۰۱/۰۱
تا
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۰۱» سال
۰۲» تاریخ
۰۳» نوع‌سند
۰۴» شماره‌سند
۰۵» انبار
۰۶» مرکز/پیمان
۰۷» ذینفع/پیمانکار
۰۸» کد رده
۰۹» شماره‌کالا
۱۰» حساب
۱۱» تفصیلی ۱/سازنده
مساوی با
باشد
و انبار مساوی با ۳۳۲ باشد
تجمیعی‌ازتمامی‌سال‌هاوشرکت‌ها
قالب گزارش
گردش
کاردکس
فرآیندخرید
استعلام‌بها
مقدار(مشروح)
ارزش(مشروح)
ارزش(اجمالی)
سفارشات‌کالا
تعدیل موجودی
سایر اقدامات
CARBON
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82
[10]
administra...
2017/08/02
1396/05/11
1438/11/09
12:33:52

PROJECT PROCUREMENT STATUS

PROCUREMENT ENGINEERING (20%)

MANUFACTURING (7

1393/12/23" 1393/01/01

Code	Description	QTY	Price (IRR)	Order Date	W.F (%)	PROCUREMENT PROCESS							VENDOR	PROGRESS %		FINISH DATE		MANUFACTURING PROCESS					PROGI
						PMR 2%	Sourcing 2%	RFQ 2%	Quotation's Collection 3%	TBE 3%	CBE 3%	Issue of P.O. 5%		plan%	actual%	plan	actual	Engineering (DWG & ITP, etc.)	Purchase of Raw Material	Mfg. Process	Test & Inspection	Packing	plan%
???	پتروپیست کیان																						
75010066161378	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,4" ,150#RF ,ASTM A105 ,Sweet Service	132	16,272,000,000	1393/11/27	16							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75010155248679	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,1" ,1500#SW ,ASTM A105 ,Sweet Service	240	4,610,400,000	1393/11/27	5							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75010273714813	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,1/2" ,1500#SCRD ,ASTM A105 ,Sweet Service	36	1,356,000,000	1393/11/27	1							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75010744080236	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,6" ,1500#RTJ ,ASTM A105	48	10,848,000,000	1393/11/27	11							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75011470572322	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,3/4 ,1500#SW-SCRD ,ASTM A105 ,Sweet	360	8,678,400,000	1393/11/27	9							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75012863853230	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,3" ,1500#RTJ ,ASTM A105 ,Sweet Service	144	9,763,200,000	1393/11/27	10							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75014056351958	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,1" ,1500#SW-SCRD ,ASTM A105 ,Sweet Service	240	4,610,400,000	1393/11/27	5							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75014163842953	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,8" ,1500#RTJ ,ASTM A105 ,Sweet Service	96	32,544,000,000	1393/11/27	33							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75022745683820	Ball valve F.B. API 6A ,4 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	6	813,600,000	1393/11/27	1								NEWAY	20	0								70
75023783444497	Ball valve F.B. API 6A ,7 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	15	2,712,000,000	1393/11/27	3								NEWAY	20	0								70
75023947348232	Ball valve F.B. API 6A ,2 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	6	230,520,000	1393/11/27	0								NEWAY	20	0								70
75113371378853	Check valve (Suing type) ASME B16.34 ,3" ,1500#RTJ ,ASTM A216 Gr.Grade WCB ,Sweet Service	36	3,145,320,000	1393/11/27	3							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75113867312921	Check valve (Suing type) ASME B16.34 ,1" ,1500#SW ,ASTM A105 ,Sweet Service	192	2,712,000,000	1393/11/27	3							1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70
75120537663441	Check valve (Suing type) API 6A ,7 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	3	33,300,000	1393/11/27	0								NEWAY	20	0								70
75161807321366	Chake valve (Adiurtable type) API 6A ,4 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	3	333,000,000	1393/11/27	0								NEWAY	20	0								70
75180925736120	Chake valve (Fixed type) API 6A ,7 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	3	678,000,000	1393/11/27	1								NEWAY	20	0								70
75243131146638	Globe valve API 6A ,2 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	6	311,880,000	1393/11/27	0								NEWAY	20	0								70
75244141156074	Globe valve API 6A ,4 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	3	271,200,000	1393/11/27	0								NEWAY	20	0								70
		2,349.0	93,930,420,000		100																		
		2,349.0	93,930,420,000		100																		

List

	S	U	W	X	Y	Z	AA	AB	AD	AF	AH	AJ	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AT	AV	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
1																											
2	NT ENGINEERING (20%)							MANUFACTURING (70%)									DELIVERY (10%)								OVERALL PROGRESS		
3	S		VENDOR	PROGRESS %		FINISH DATE		MANUFACTURING PROCESS					PROGRESS (%)		FINISH DATE		DELIVERY PROCESS				PROGRESS (%)		FINISH DATE				
4	CBE 3%	Issue of P.O. 5%		plan%	actual%	plan	actual	Engineering (DWG & ITP, etc.)	Purchase of Raw Material	Mfg. Process	Test & Inspection	Packing	plan%	actual%	plan	actual	ExWork Delivery	Delivery to Port	Custom Clearance	Devivery to Site	plan%	actual%	plan	actual	plan	actual	
5																											
6		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	3.3
7		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	0.9
8		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	0.3
9		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	2.2
10		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	1.7
11		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	2.0
12		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	0.9
13		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	6.5
14			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
15			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
16			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
17		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	0.6
18		1393/05/01	CMK	20	20	1393/04/20	1393/05/01						70	0							10	0			100	20	0.5
19			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
20			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
21			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
22			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
23			NEWAY	20	0								70	0							10	0			100	0	0.0
24																										19	
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											

List

گزارش مقایسه سفارشات و کالای رسیده به انبار

شماره	عنوان	واحد	تقاضای خرید			ثبت سفارش		فیاتوشده سفارش	وارده به انبار		کالای در راه	
	۱۳۹۳/۰۱/۰۱ ~ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		مقدار	ارزش (ریال)	نرخ واحد	مقدار	ارزش (ریال)	مانده	مقدار	ارزش (ریال)	مقدار	ارزش (ریال)
332	پروژه تهیه کالا و تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E۰۲۵N چشمه خوش											
75010066161378	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,4" ,150#RF ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۱۲	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۲	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
75010155248679	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,1" ,1500#SW ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۱۵	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۵	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰
75010273714813	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,1/2" ,1500#SCRD ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۶	۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۰۰۰	۶	۸۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۸۴,۷۵۰,۰۰۰
75010744080236	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,6" ,1500#RTJ ,ASTM A105	no	۳	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰
75011470572322	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,3/4" ,1500#SW-SCRD ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۶۰	۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۶۰	۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۵۴۲,۴۰۰,۰۰۰
75012863853230	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,3" ,1500#RTJ ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۹	۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۹	۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹	۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰
75014056951958	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,1" ,1500#SW-SCRD ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۱۵	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۵	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰
75014169842953	Ball valve F.B. ASME B16.34 ,8" ,1500#RTJ ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۶	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
75022745683820	Ball valve F.B. API 6A ,4 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	no	۶	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۶	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰
75023783444497	Ball valve F.B. API 6A ,7 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	no	۱۵	۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰
75023947348232	Ball valve F.B. API 6A ,2 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	no	۶	۲۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۰,۰۰۰	۶	۲۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۰,۵۲۰,۰۰۰
75113371378859	Check valve (Swing type) ASME B16.34 ,3" ,1500#RTJ ,ASTM A216 Gr.Grade WCB ,Sweet Service	no	۶	۱۹۶,۶۲۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۰,۰۰۰	۶	۱۹۶,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۱۹۶,۶۲۰,۰۰۰
75113867312921	Check valve (Swing type) ASME B16.34 ,1" ,1500#SW ,ASTM A105 ,Sweet Service	no	۱۲	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۲	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰
75120537663441	Check valve (Swing type) API 6A ,7 1/16" ,3000RTJ ,60K ,Temp Class PU/PV ,Mat. Class BB ,Sweet Service ,PSL2 PR1	no	۳	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۹۰۰,۰۰۰
	Choke valve (Adjustable type) API 6A ,4 1/16" ,3000RTJ											

List


کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه
ERP SCM PCM HRM DCC CA BI
v5.8.7.4 web / build 2173
1393
تدارکات کالا و انبار
مدیریت بهای پروژه
مرکز کنترل اسناد
عملیات مبنا
اطلاعات مبنا
جداول پایه
اقلام هزینه
اطلاعات پیمانکاران
اطلاعات قراردادی پیمان
مشخصات اولیه پیمان
تعهدات مالی پیمان
درخواست ثبت الحاقیه
برآورد و بودجه
بودجه نقدی و برآوردی
پیشرفت فیزیکی
پرداختی پیمان
ثبت صورت وضعیت
پرداخت صورت وضعیت
گزارشات و مستندات
طراحی گزارشات
بانک الصاقات
CARBON
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82
[10]
administra...
2017/08/02
1396/05/11
1438/11/09
12:36:07

کربن :: برنامه ریزی منابع سازمانی چند زبانه

ERP SCM PCM HRM DCC CA BI | v5.8.7.4 web / build 2173 | 1393

اطلاعات پیمان ها

کد پروژه	عنوان	مناقصه/قرارداد	شروع به‌کار	تحویل زمین	مدت
۵۰-۷۳-۴۰۱۶۲	تهیه کالا اختصاصی چند راهه ۷ حلقه چاه و خطوط لوله جریانی انتقال ۸ اینچ و نصب مرکز جمع آوری و				
۵۰-۷۳-۴۰۱۹۰	انتقال نفت از واحد بهره برداری سرکان به تلمبه خانه برداسبی		۱۳۸۷/۰۴/۰۲		
۵۰-۷۳-۴۰۲۰۲	بهینه سازی تاسیسات و احداث نمکزدایی سرکان	۸۶/۳۲۸	۱۳۸۷/۰۷/۰۶		۱۱۸۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۰۹	توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش بصورت EPC		۱۳۸۷/۰۹/۰۳		
۵۰-۷۳-۴۰۲۱۹	احداث تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه ۴ پایدار شرق		۱۳۸۸/۱۲/۰۱		۳۶۵

مشخصات

اطلاعات

فعالیتها

تحویل زمین

شماره‌نامه

پایان‌کار موقت

شماره‌نامه

پایان‌کار دائم

شماره‌نامه

مدت پروژه: ۳۹ ماه

زمان مانده: ۶۸- مانده

سرفصل هزینه	مبلغ : ریال	مبلغ : ارز	ش.سند
۱۱۰	۱۳۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۷۱
۱۱۱	۱۵,۹۴۹,۹۷۴,۲۶۱	۰	۱۰۰۰۰۰۷۲
۲۱۰	۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۷۱
۲۱۱	۴,۳۶۴,۲۱۷,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۷۲
۳۱۰	۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰۷۱
۳۱۰	۲,۶۷۷,۴۰۸,۵۵۱	۰	۱۰۰۰۰۰۷۲

Σ جمع ریالی: ۲۰۱,۴۹۱,۵۹۹,۸۱۲ جمع ارزی: ۰

تسعیر ارز

ارز	نرخ
EUR	۳۰,۰۰۰

db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WDMM9 * mc:00-0C-29-6D-10-82 | [10] | administra... | 2017/08/02 | 1396/05/11 | 1438/11/09 | 12:35:45

وضعیت پیشرفت اجمالی پیمانها

کد پیمان	عنوان	مجری	شروع به کار	پیمان				مبلغ کل	دوره قبل : ۱۳۹۳/۰۵/۰۱				دوره جاری : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				پیش بینی	
				مهندسی	کالا	اجرا			مهندسی	کالا	اجرا	جمع	مهندسی	کالا	اجرا	جمع	کالا	مهندسی
۵۰-۷۳-۴۰۱۶۲	تهیه کالا اختصاصی چند راهه ۷ طبقه چاه و خطوط لوله جریانی انتقال ۸ اینچ و نصب مرکز جمع آوری و خطوط	طرح نصب صحت		۰	۱۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۱۹۰	انتقال نفت از واحد بهره برداری سرکان به تلمبه خانه برداسپی	سیمین تابان لرستان	۱۳۸۷/۰۴/۰۲	۰	۷۰	۳۰			۰	۸۹	۷۴	۱۶۳	۰	۸۹	۷۴	۱۶۳	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۰۲	بهینه سازی تاسیسات و احداث نمکزدایی سرکان	آبزولوت	۱۳۸۷/۰۷/۰۶	۴	۷۶	۱۹			۳۹	۱۲	۴۶	۹۸	۳۹	۱۴	۴۶	۱۰۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۰۹	توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش بصورت EPC	بهین سامان سرزمین	۱۳۸۷/۰۹/۰۳	۵	۷۱	۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۱۹	احداث تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه ۴ پایدار شرق	اهواز سماتک	۱۳۸۸/۱۲/۰۱	۰	۶۶	۳۴			۰	۳۶	۳۲	۶۸	۰	۳۶	۳۲	۶۸	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۲۳	تهیه کالا و نصب تسهیلات سر چاهی و خط لوله جریانی چاه شماره ۲۳ دهلران	آرشین صنعت پارمیدا		۰	۹۰	۱۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۳۲	پروژه تهیه کالا و اجرای تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه شماره ۲۶ دهلران	بینک مکانیک	۱۳۸۸/۰۴/۰۱	۰	۷۸	۲۲			۰	۹۳	۴۰	۱۳۳	۰	۹۳	۴۰	۱۳۳	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۴۰	تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی خط لوله جریانی ۸ اینچ چاه شماره ۱۵ پایدار غرب	آبفرتاسیسات ماد کهن	۱۳۸۸/۰۶/۰۱	۰	۸۱	۱۹			۰	۸۳	۶۹	۱۵۱	۰	۸۳	۶۹	۱۵۱	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۴۷	تهیه کالا و نصب تهسیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه شماره ۱۳ پایدار غرب	پارسیان آبدان گستر		۰	۸۲	۱۸			۰	۹۲	۷۷	۱۶۹	۰	۹۲	۷۷	۱۶۹	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۵۰	احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز چشمه خوش	آذرآب	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۳	۷۵	۲۲			۸۰	۹	۴۷	۱۳۶	۸۰	۹	۴۹	۱۳۸	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۵۷	پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه شماره ۲۷ جدید دهلران	آذریام	۱۳۸۹/۰۳/۱۷	۰	۷۱	۲۹			۰	۵۷	۱۱۲	۱۶۸	۰	۵۷	۱۱۲	۱۶۹	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۶۳	نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت W۰۴۰N پایدار غرب	زیماوران	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۰	۴۹	۵۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۶۵	تهیه کالا و اجرای بخش اول خط لوله ۱۶ اینچ از واحد بهره برداری دهلران به چشمه خوش	ارنش	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۰	۸۹	۱۱			۰	۵۷	۴۹	۱۰۶	۰	۵۷	۴۹	۱۰۶	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۶۶	تهیه کالا و اجرای بخش اول خط لوله ۱۶ اینچ از احد بهره برداری دهلران به چشمه خوش	نصب صنعت پارسیان	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۰	۸۰	۲۰			۰	۵۱	۷۲	۱۲۳	۰	۵۱	۹۲	۱۴۳	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۸۳	تهیه کالا و نصب تسهیلات سر چاهی ۱۷ پایدار غرب بصورت	مارون تکنیک		۰	۷۴	۲۶			۰	۹۷	۸۸	۱۸۵	۰	۹۷	۸۸	۱۸۵	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۲۸۴	پروژه توسعه چند راهه پایدار غرب	سنا اندیشه	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۰	۷۳	۲۷			۰	۶۷	۹۹	۱۶۵	۰	۶۷	۹۹	۱۶۵	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۳۱۸	پروژه تهیه کالا و اجرای خط لوله جریانی از موقعیت W۰۱۱ دهلران	ویراکاو	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۳۲۸	تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی موقعیت W۰۱۱N پایدار غرب	زیماوران	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۰	۷۱	۲۹			۰	۰	۲۸	۲۸	۰	۰	۴۱	۴۱	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۳۳۱	پروژه تهیه کالا و نصب تسهیلات سرچاهی موقعیت E۰۰۴N پایدار غرب	ایمن بهینه ساز	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۳۳۲	پروژه تهیه کالا و تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E۰۲۵N چشمه خوش	پتروزیست کیان	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰-۷۳-۴۰۳۴۶	تهیه کالا و اجرای تسهیلات سرچاهی موقعیت W۰۶۲N پایدار غرب	ویراکاو	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۰	۱۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

C A R B O N : Enterprise Resource Planning

ERP SCM PCM HRM SCA WfM | v5.8.7.1 web / build 1957 | 1393

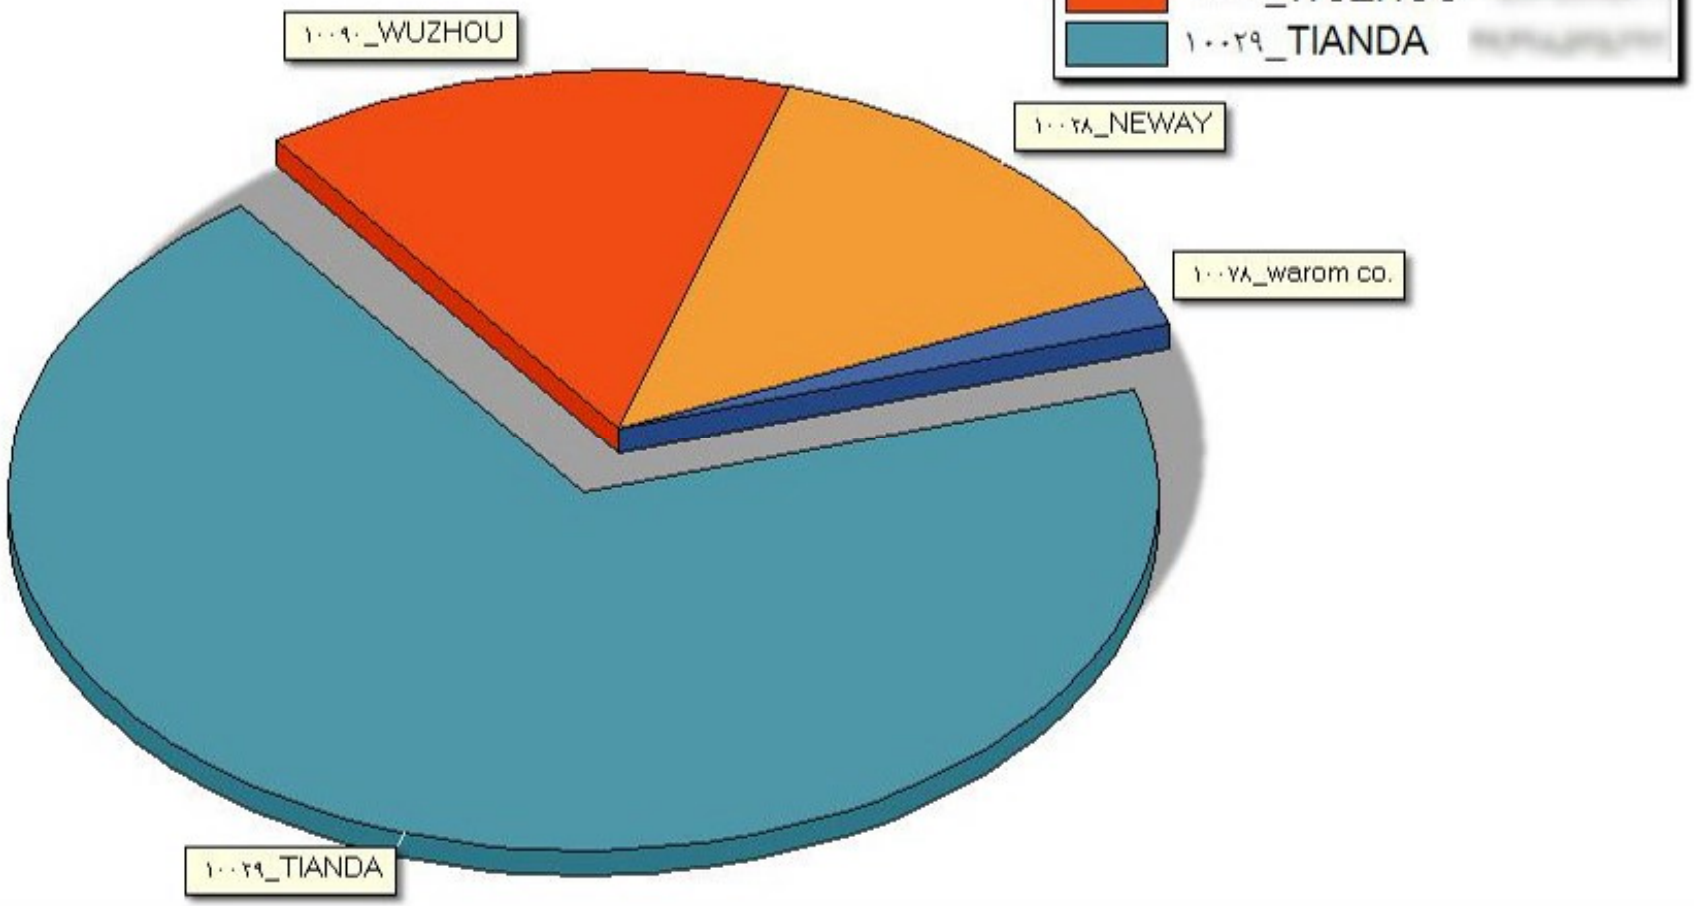
C A R B O N : Chart Generator and BI

Horiz.Offset: -111 Vert.Offset: 40

3D Mark Legenc Mono

ارزش سفارشات از چین به تفکیک سازنده

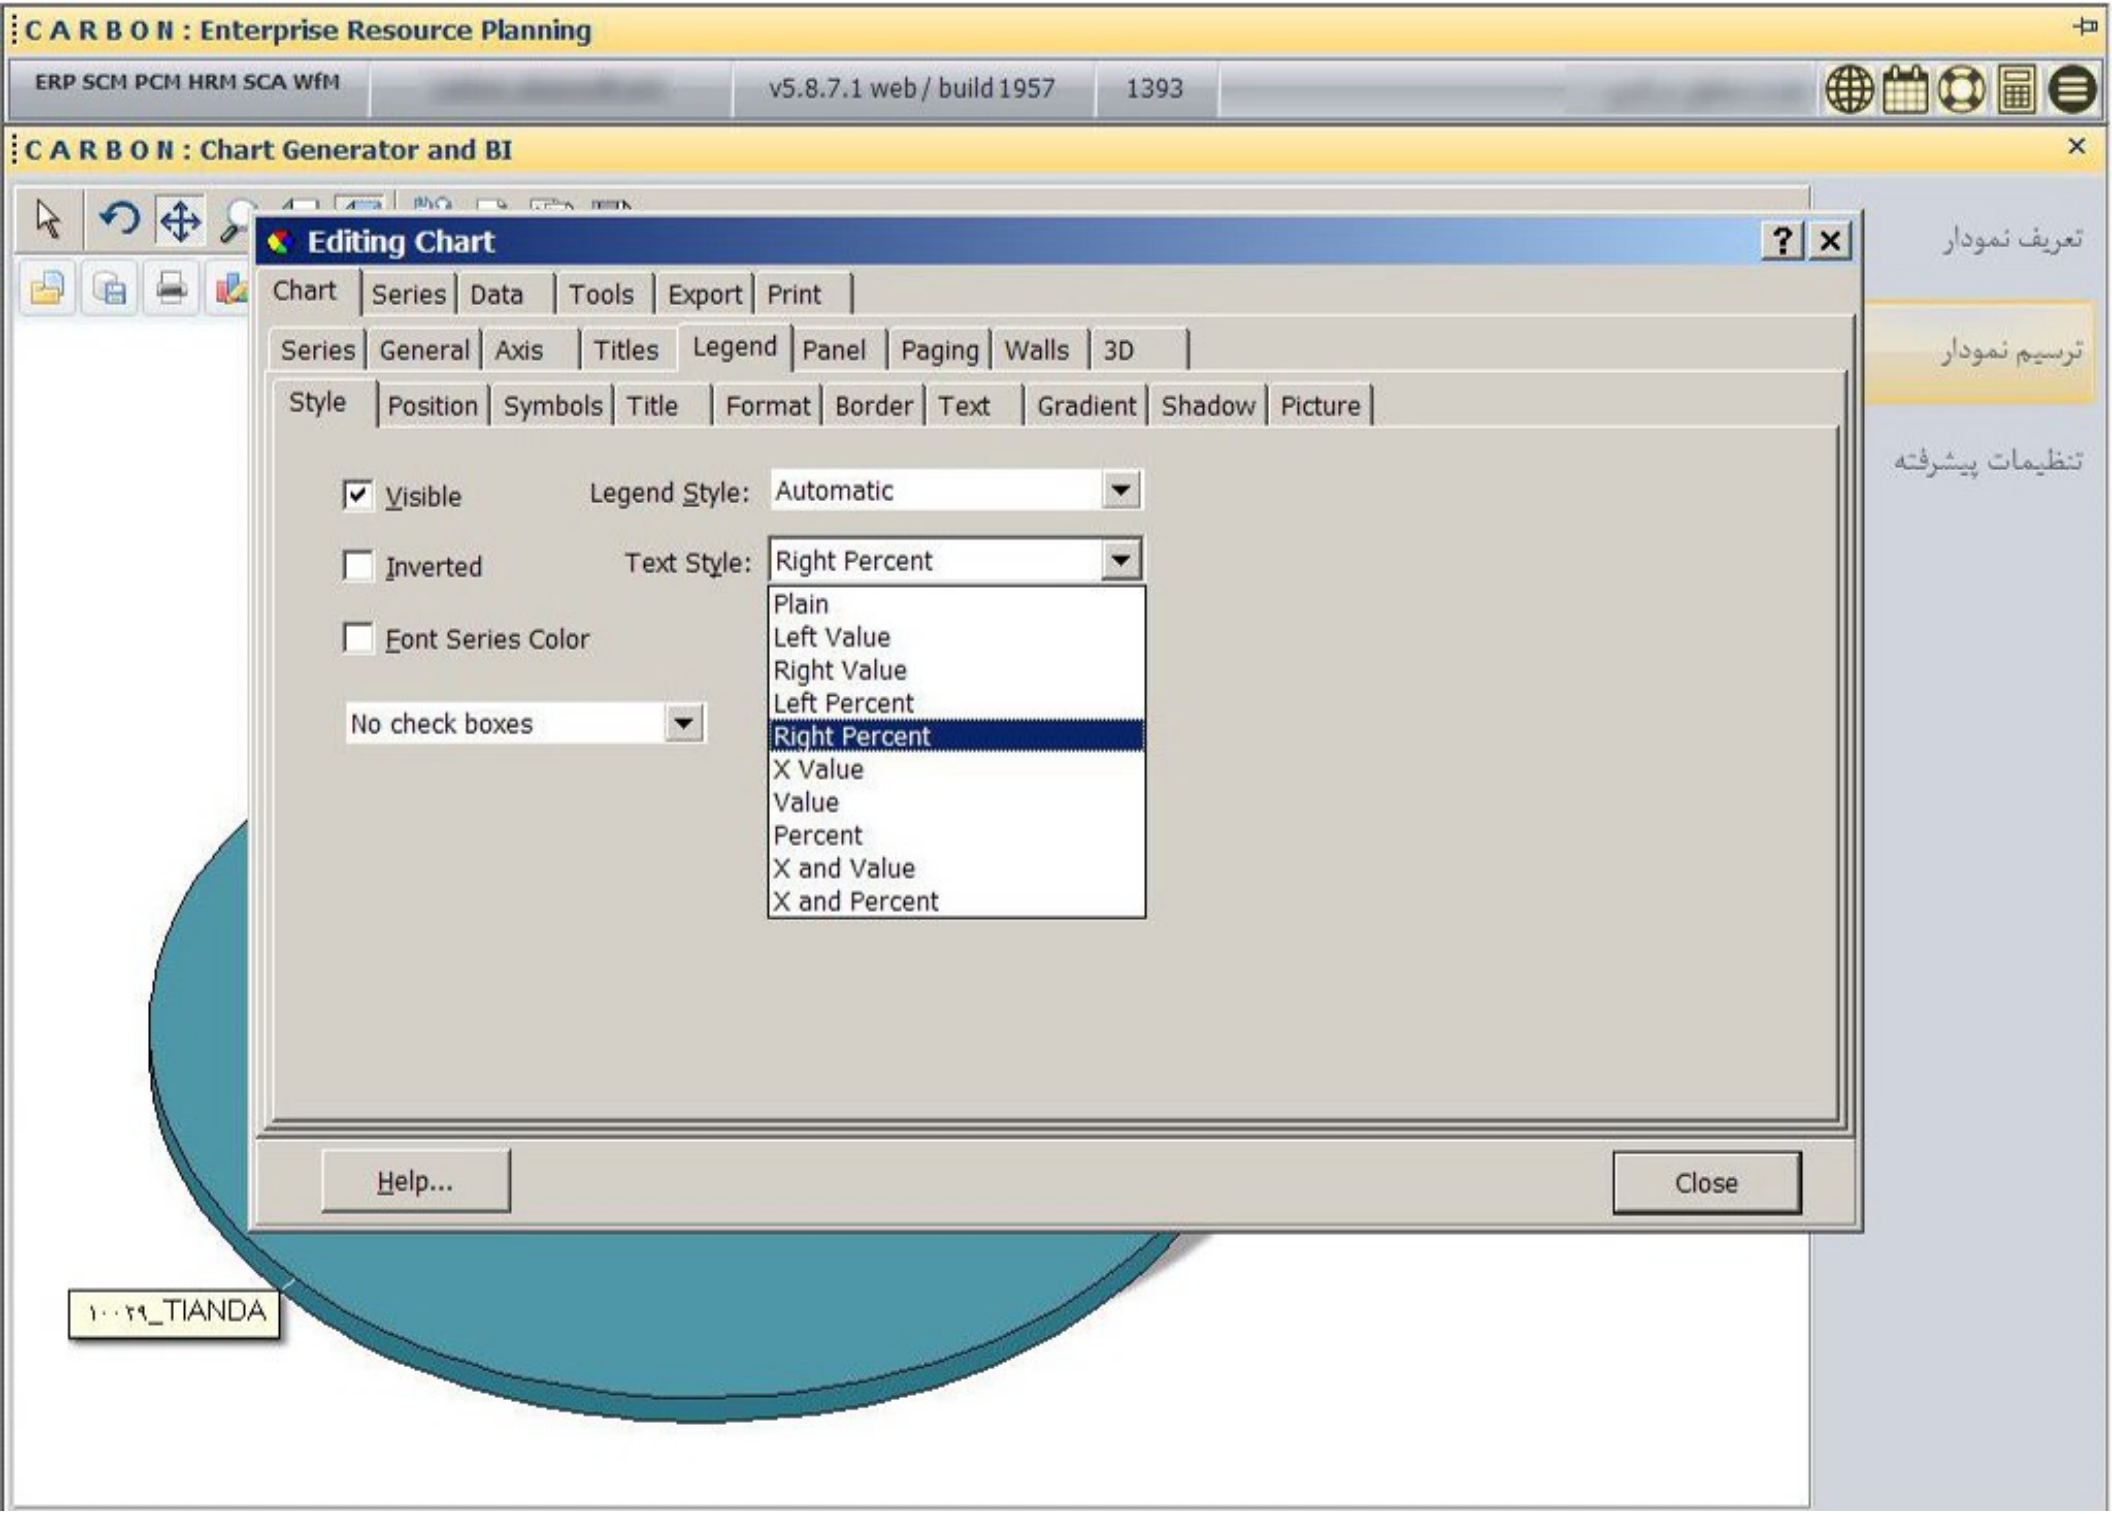
۱۰۰۷۸_warom co.
۱۰۰۲۸_NEWAY
۱۰۰۹۰_WUZHOU
۱۰۰۲۹_TIANDA



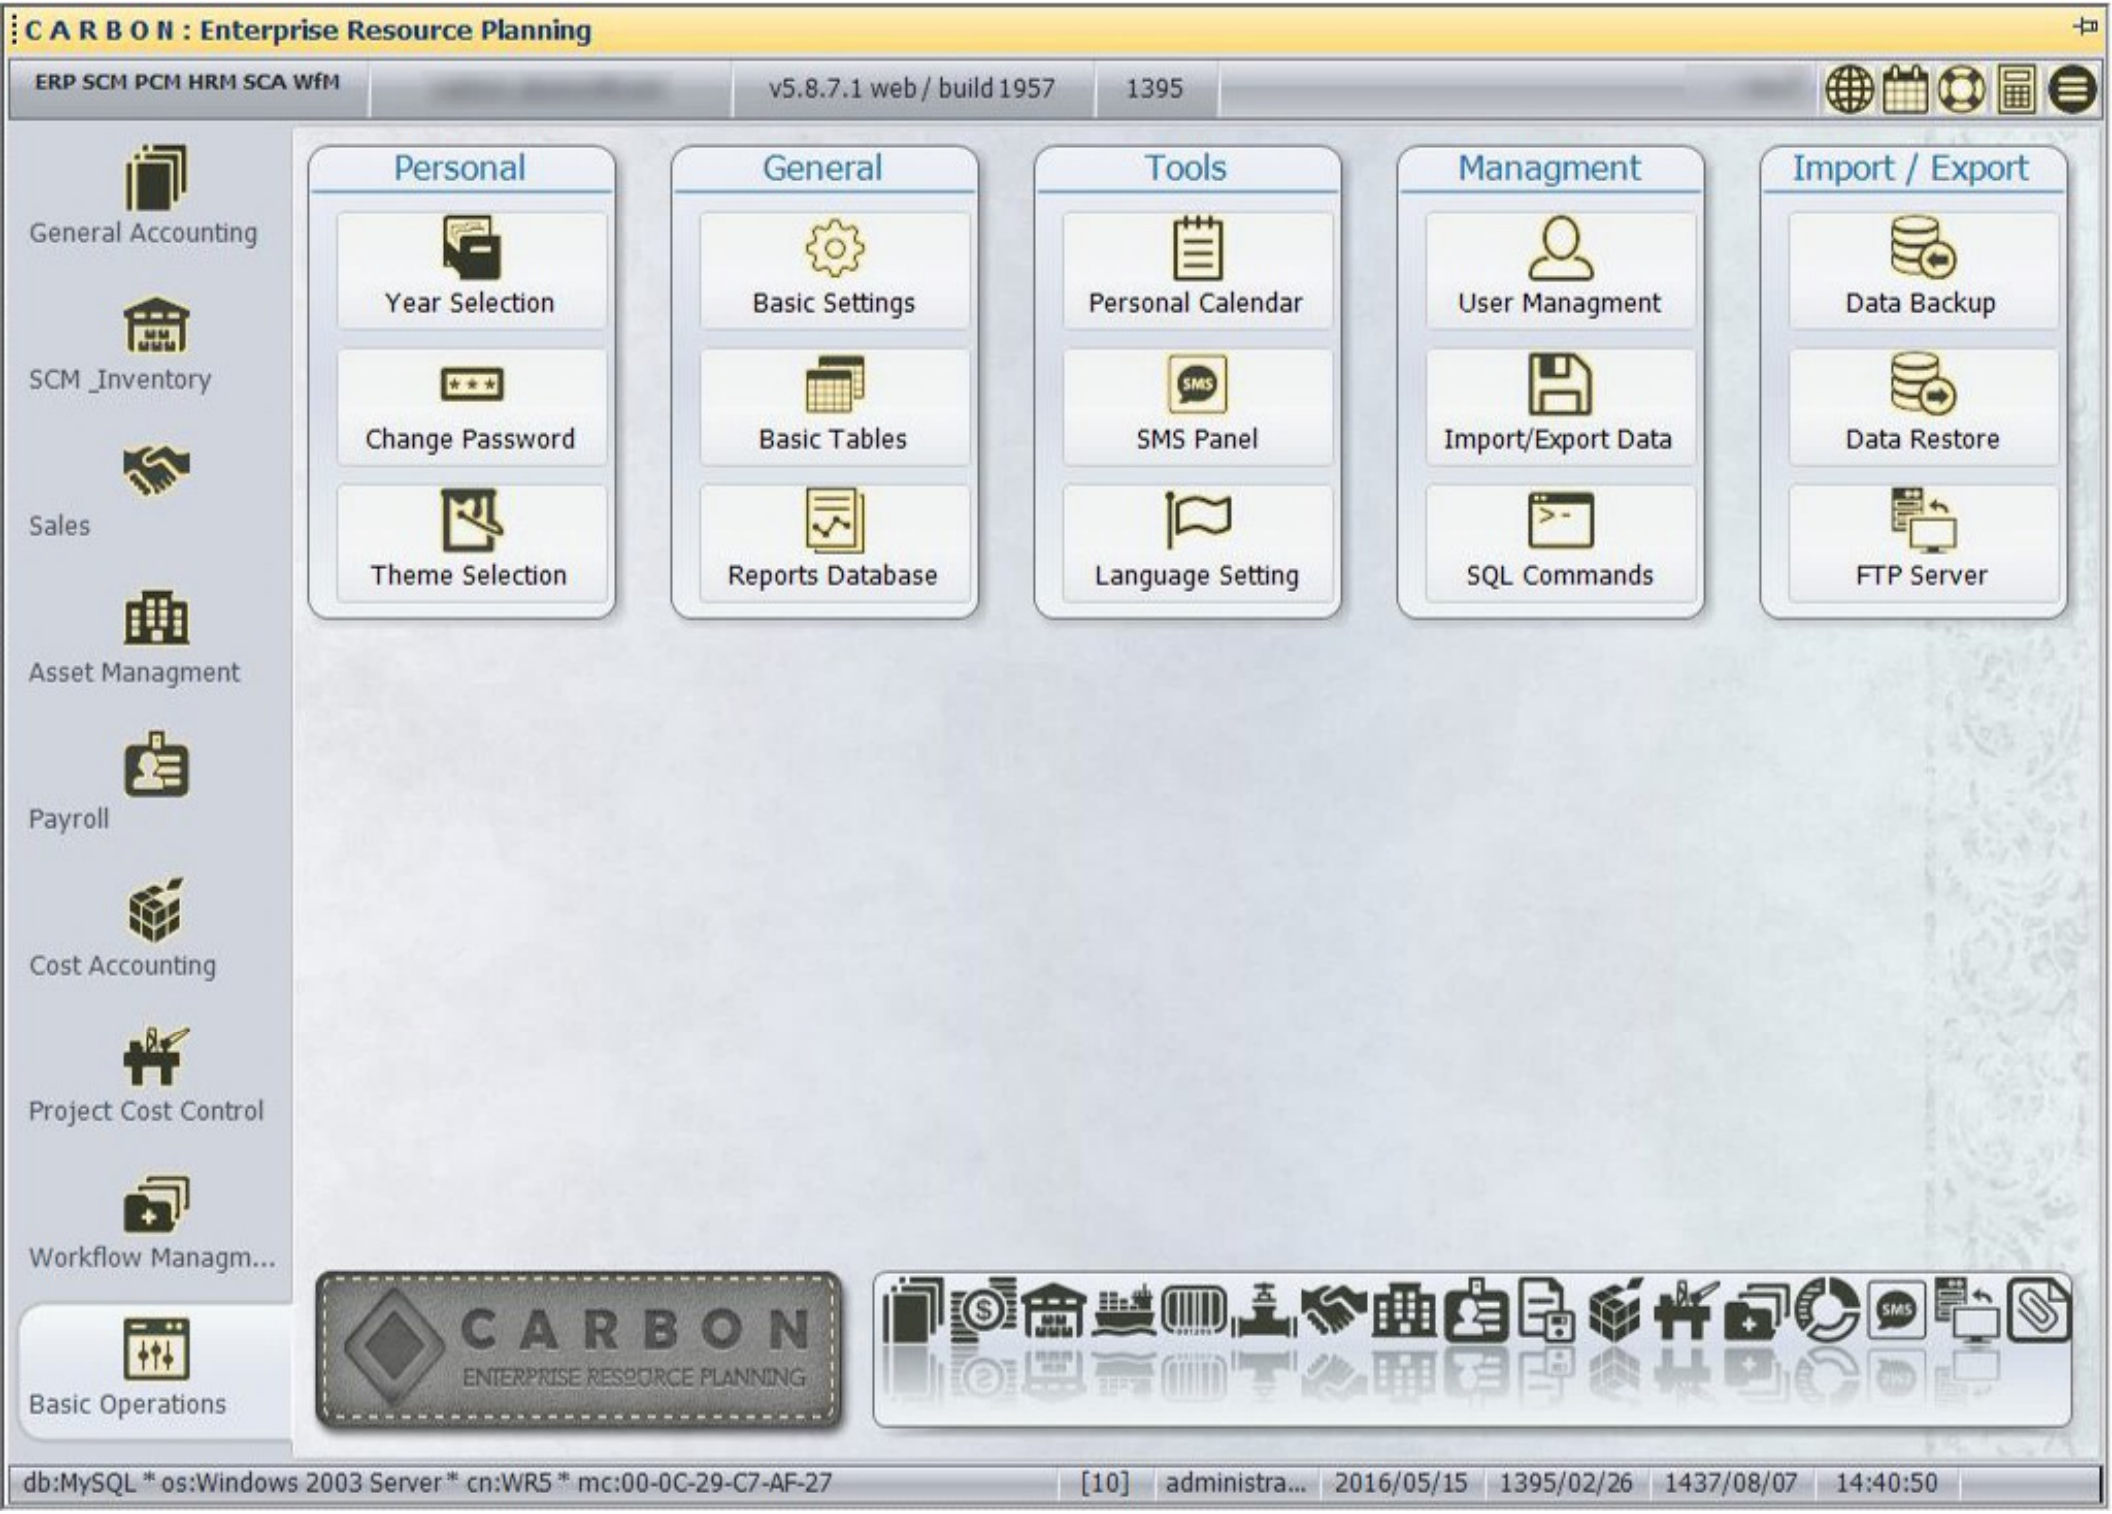
تعریف نمودار

ترسیم نمودار

تنظیمات پیشرفته


CARBON : Enterprise Resource Planning
ERP SCM PCM HRM SCA WfM
v5.8.7.1 web / build 1957
1393
CARBON : Chart Generator and BI
تعریف نمودار
ترسیم نمودار
تنظیمات پیشرفته
Editing Chart
Chart
Series
Data
Tools
Export
Print
Series
General
Axis
Titles
Legend
Panel
Paging
Walls
3D
Style
Position
Symbols
Title
Format
Border
Text
Gradient
Shadow
Picture
Visible
Inverted
Font Series Color
No check boxes
Legend Style:
Automatic
Text Style:
Right Percent
Plain
Left Value
Right Value
Left Percent
Right Percent
X Value
Value
Percent
X and Value
X and Percent
Help...
Close
۱۰۰۲۹_TIANDA


CARBON : Enterprise Resource Planning
ERP SCM PCM HRM SCA WfM
v5.8.7.1 web / build 1957
1395
کاربری
گزینش دوره
تغییر رمزعبور
انتخاب رنگ زمینه
عمومی
تنظیمات مبنا
جداول پایه
ابزارها
سررسید شخصی
سامانه پیام‌کوتاه
مدیریت
دسترسی کاربران
بازخوانی و تبدیل فایل
ارسال و دریافت
تهیه پشتیبان
بازگردانی داده‌ها
ارتباط با فایل سرور
حسابداری عمومی
تدارکات کالا و انبار
فروش و سفارشات
اموال و دارایی‌ها
حقوق و دستمزد
حسابداری صنعتی
کنترل بهای پروژه
مدیریت گردش‌کار
عملیات مبنا
انتخاب زبان
العربية
עברית
فارسی
Español
English
हिन्दी
Polski
Svenska
Français
Italiano
Português
Türkçe
Deutsch
Nederlands
русский
اردو
CARBON
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WR5 * mc:00-0C-29-C7-AF-27
[10]
administra...
2016/05/15
1395/02/26
1437/08/07
14:41:30


CARBON : Enterprise Resource Planning
ERP SCM PCM HRM SCA WfM
v5.8.7.1 web / build 1957
1395
General Accounting
SCM _Inventory
Sales
Asset Managment
Payroll
Cost Accounting
Project Cost Control
Workflow Managm...
Basic Operations
Personal
Year Selection
Change Password
Theme Selection
General
Basic Settings
Basic Tables
Reports Database
Tools
Personal Calendar
SMS Panel
Language Setting
Managment
User Managment
Import/Export Data
SQL Commands
Import / Export
Data Backup
Data Restore
FTP Server
CARBON
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
db:MySQL * os:Windows 2003 Server * cn:WR5 * mc:00-0C-29-C7-AF-27
[10]
administra...
2016/05/15
1395/02/26
1437/08/07
14:40:50
